



**Модельный комплекс
мероприятий по внедрению
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей в
субъектах Российской
Федерации**

2019

Модельный комплекс мероприятий представлен в виде дорожных карт:

- **основная дорожная карта** представляет собой перечень мероприятий, **выполняемых на региональном и муниципальном уровне**, в обязательном порядке всеми субъектами Российской Федерации, внедряющими систему персонифицированного финансирования;
- **дорожные карты по моделям** представляют собой перечни мероприятий, **выполняемых на муниципальном уровне** в зависимости от выбранной субъектом Российской Федерации модели персонифицированного финансирования.

№2,4

№1



1. Выбор
модели ПФ
ДОД условий
внедрения

2. Создание Межве
домственного совета
по внедрению и реа
лизации Целевой
модели ДОД

срок
 $X+30$

Региональный

3. Информирование о
начале внедрения
Целевой модели ДОД

срок
 $X+5$

Региональный

4. Создание рабочих
групп по внедрению
и реализации Целе
вой модели ДОД

срок
 $X+15$

Муниципальный

5.Подписание соглаше
ний между субъектом
РФ и пилотными мун
ципальными образова
ниями

срок
X+30

Региональный

6.Принятие Постановле
ния высшего органа ис
полнительной власти
субъекта РФ о внедре
нии ПФ ДОД

срок
X+30

Региональный

7.Принятие норматив
но-правового акта реги
онального органа ис
полнительной власти с
приложением Правил
ПФ ДОД

срок
X+60

Региональный

8.Принятие норматив
но-правового акта
ОМСУ с приложением
Правил ПФ ДОД

срок
X+70

Муниципальный

ПОСЛЕ
4 шага

9. Расчет параметров
персонифицирован
ного финансирова
ния

срок
 $X+50$

Муниципальный

10. Подготовка слу
жебной записки о
необходимости
перераспределения
бюджетных средств

срок
 $X+60$

Муниципальный

11. Внесение измене
ний в решение о
местном бюджете

срок
 $X+80$

Муниципальный

ПОСЛЕ
8 и 9 шага

12. Принятие нормативно-правового акта об утверждении программы ПФ ДОД

срок
 $X+80$

Муниципальный

ПОСЛЕ
8 и 9 шага

13. Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)

срок
 $X+80$

Муниципальный

ПОСЛЕ
11 шага

14. Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы для закрепления мероприятия по ПФ ДОД

срок
 $X+80$

Муниципальный

15. Внесение изменений в государственную программу развития образования

срок
X+110

Региональный

ПОСЛЕ
7 шага

16. Принятие нормативно-правового акта органа исполнительной власти субъекта РФ о проведении независимой оценки качества доп.общеобразов. программ в форме общественной экспертизы

срок
X+60

Региональный

ПОСЛЕ
11 шага

17. Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД

срок
X+100

Муниципальный

ПОСЛЕ
7 шага

18. Принятие приказа
регион. оператора ПФ
ДОД об утверждении
типовых форм докумен
тов, наделении мун
цип. учреждений
частью полномочий
оператора по использо
ванию АИС Навигатор
ДОД в части операций с
сертификатами

срок
X+80

Региональный

ПОСЛЕ
7 шага

19. Проведение
1 этапа информаци
онной кампании о вве
дении ПФ ДОД

срок
X+80

Региональный
и муниципальный

20. Проведение
2 этапа информаци
онной кампании о введе
нии ПФ ДОД

Апрель-
май

Региональный
и муниципальный

21. Проведение
3 этапа информацион-
ной кампании о введе-
нии ПФ ДОД

Август-
сентябрь

Муниципальный

22. Внесение измене-
ний в локальные акты
муниципальных по-
ставщиков образова-
тельных услуг

срок
X+100

Муниципальный


23. Перераспреде-
ние остатков неиг-
пользованных
средств, предусмо-
тренных на обеспече-
ние сертификатов

Ноябрь-
декабрь

Муниципальный

ПОСЛЕ
18 шага

Операторская модель (СОНКО)

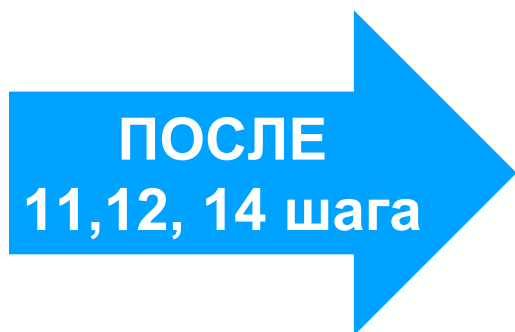

I.1. Принятие порядка поддержки социально-ориентированных организаций

срок
 $X+120$

Муниципальный



I.2. Проведение конкурса на выбор уполномоченной организации

срок
 $X+140$

Муниципальный





I.3. Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения реализации проекта по ПФ ДОД

срок
Y+150

Муниципальный




I.4. Заключение СОНКО договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образоват. услуг по реализации доп. общеобраз. программ в рамках системы ПФ ДОД с поставщиками образовательных услуг

Август

Муниципальный

Операторская модель (бюджетное или автономное учреждение)

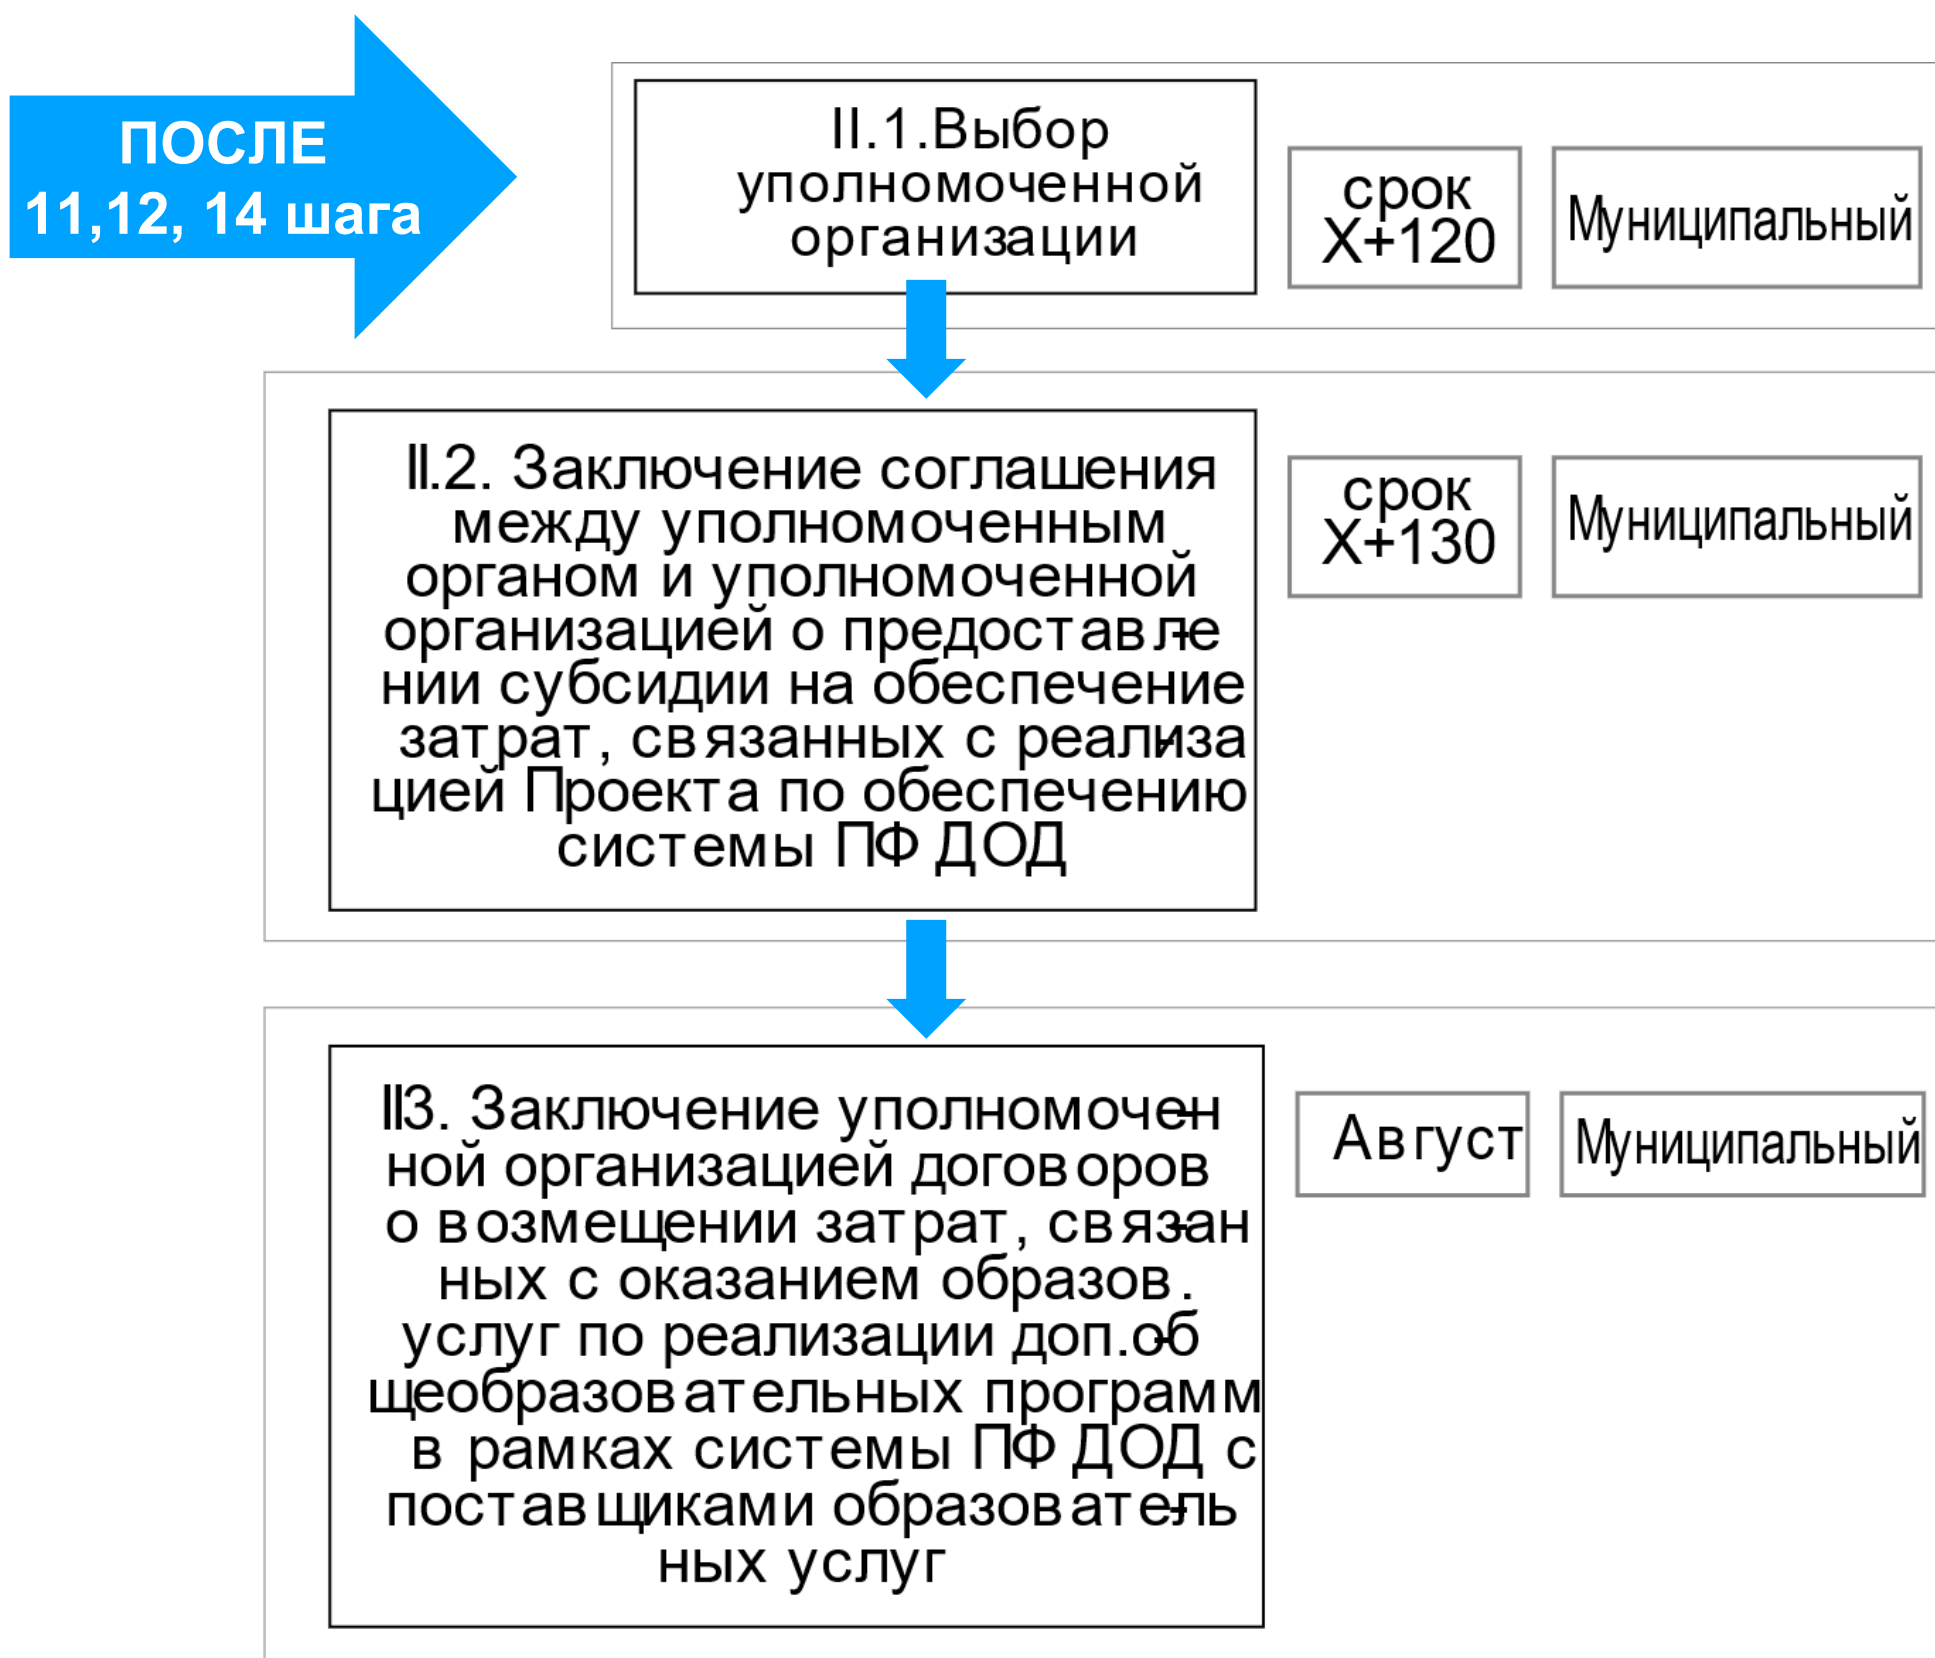


Безоператорская модель

ПОСЛЕ
8 шага

III.1. Принятие нормативно-правового акта
ОМСУ о внесении
изменений в порядок
формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий

срок
 $X+75$

Муниципальный



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**
